

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EL DESARROLLO RURAL EN MONTES PÚBLICOS Y CONSORCIADOS DE LA COMARCA DE LA SIBERIA EXTREMEÑA.

Expediente: 09N1011FR075

Promotor:



Contratista:



Director de Obra: Fernando Gamero Guerrero. Ingeniero de Montes.

Jefe de Obra: Rodrigo Julián Fuentes. Ingeniero de Montes.

Informe Gráfico de la Obra

Importe de licitación: 675.073,04 €

Importe de adjudicación: 471.808,55 €

Plazo de ejecución: 18 meses



1.- M.U.P nº6. – Zona de Roza Manual.

Término Municipal: Helechosa de los Montes


Unidades de Obra ejecutadas:

- *Roza con motodesbrozadora del estrato arbustivo.*
- *Poda y formación de las encinas existentes en el monte.*
- *Recogida y acordonado de los residuos generados.*
- *Eliminación de los residuos con trituradora de martillos*
- *Medición ejecutada: 15,27ha*

1.- M.U.P n°6. – Zona de Roza Manual.



1.- M.U.P n°6. – Zona de Roza Manual.

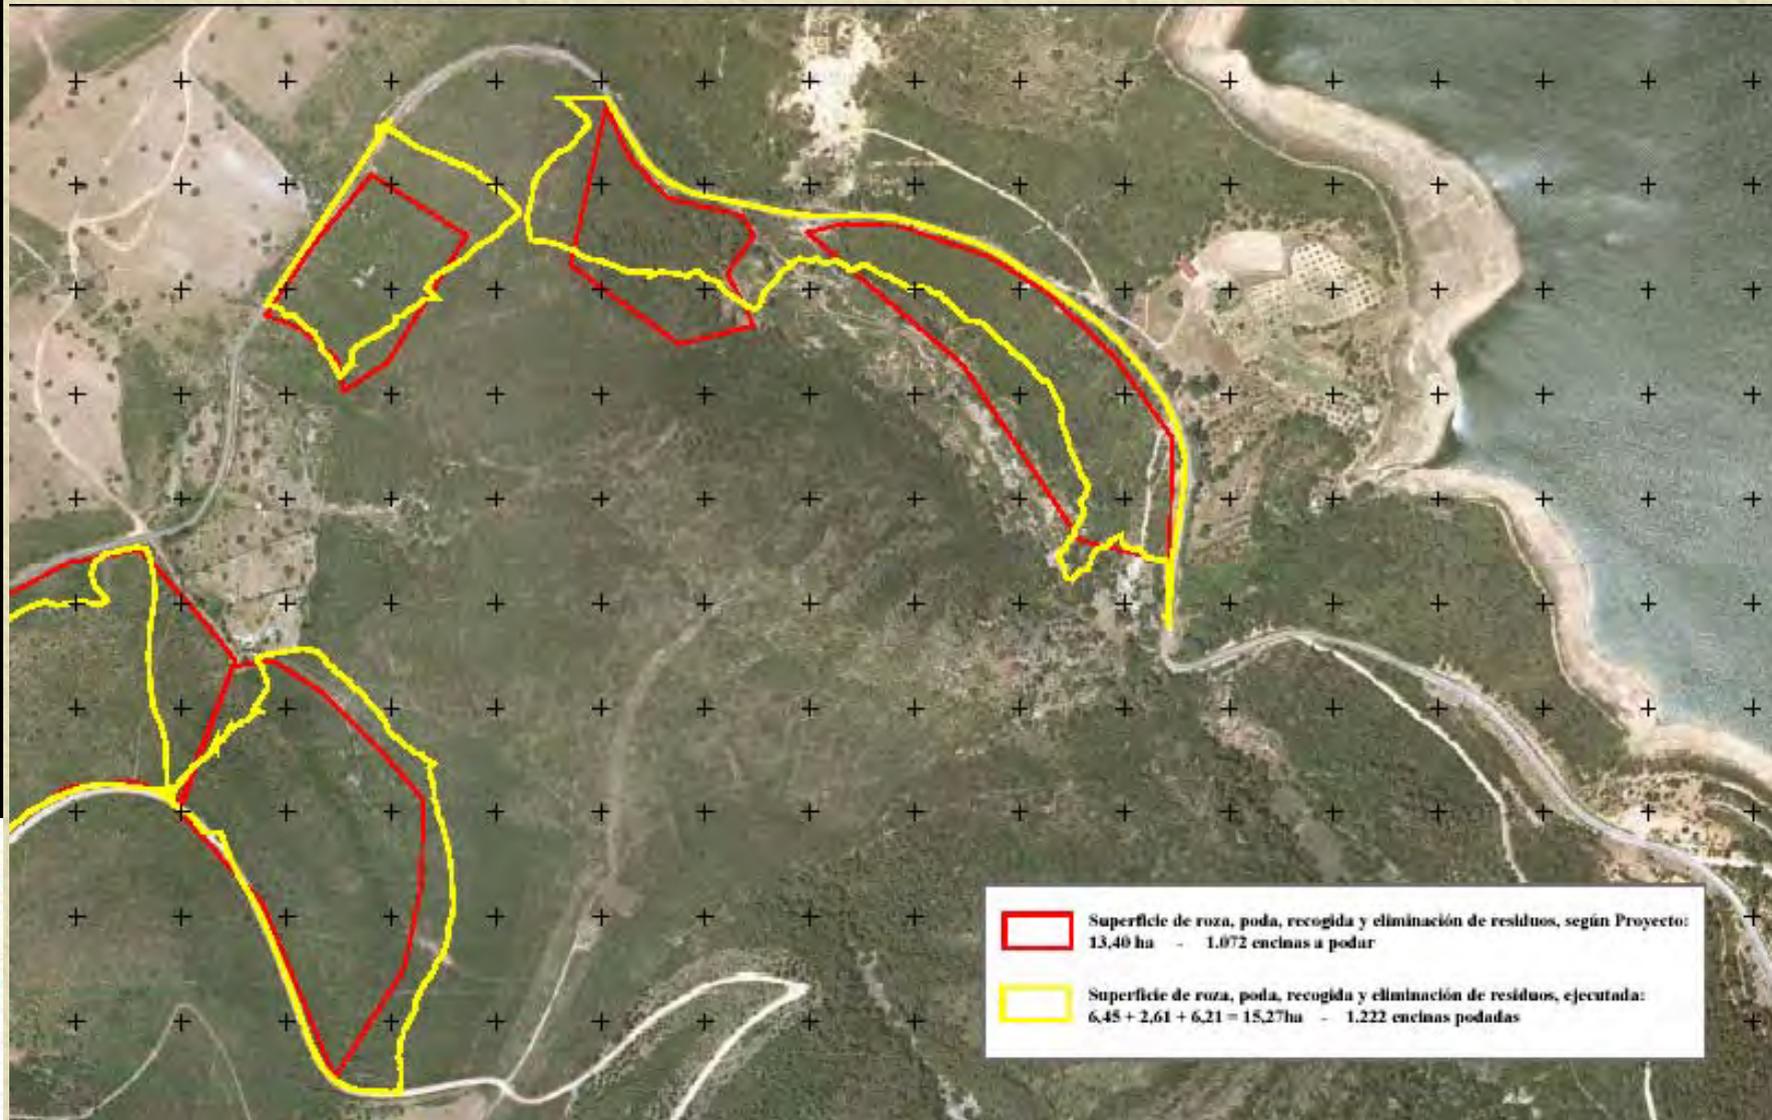

2.- M.U.P n°6. – Zona de roza mecanizada

Término Municipal: Helechosa de los Montes


Unidades de Obra ejecutadas:

- Doble pase de grada.



2.- M.U.P n°6. – Zona de roza mecanizada

-  Superficie a gradear, según Proyecto: 19,00 ha
-  Superficie graduada: 9,54 + 7,47 = 17,01ha

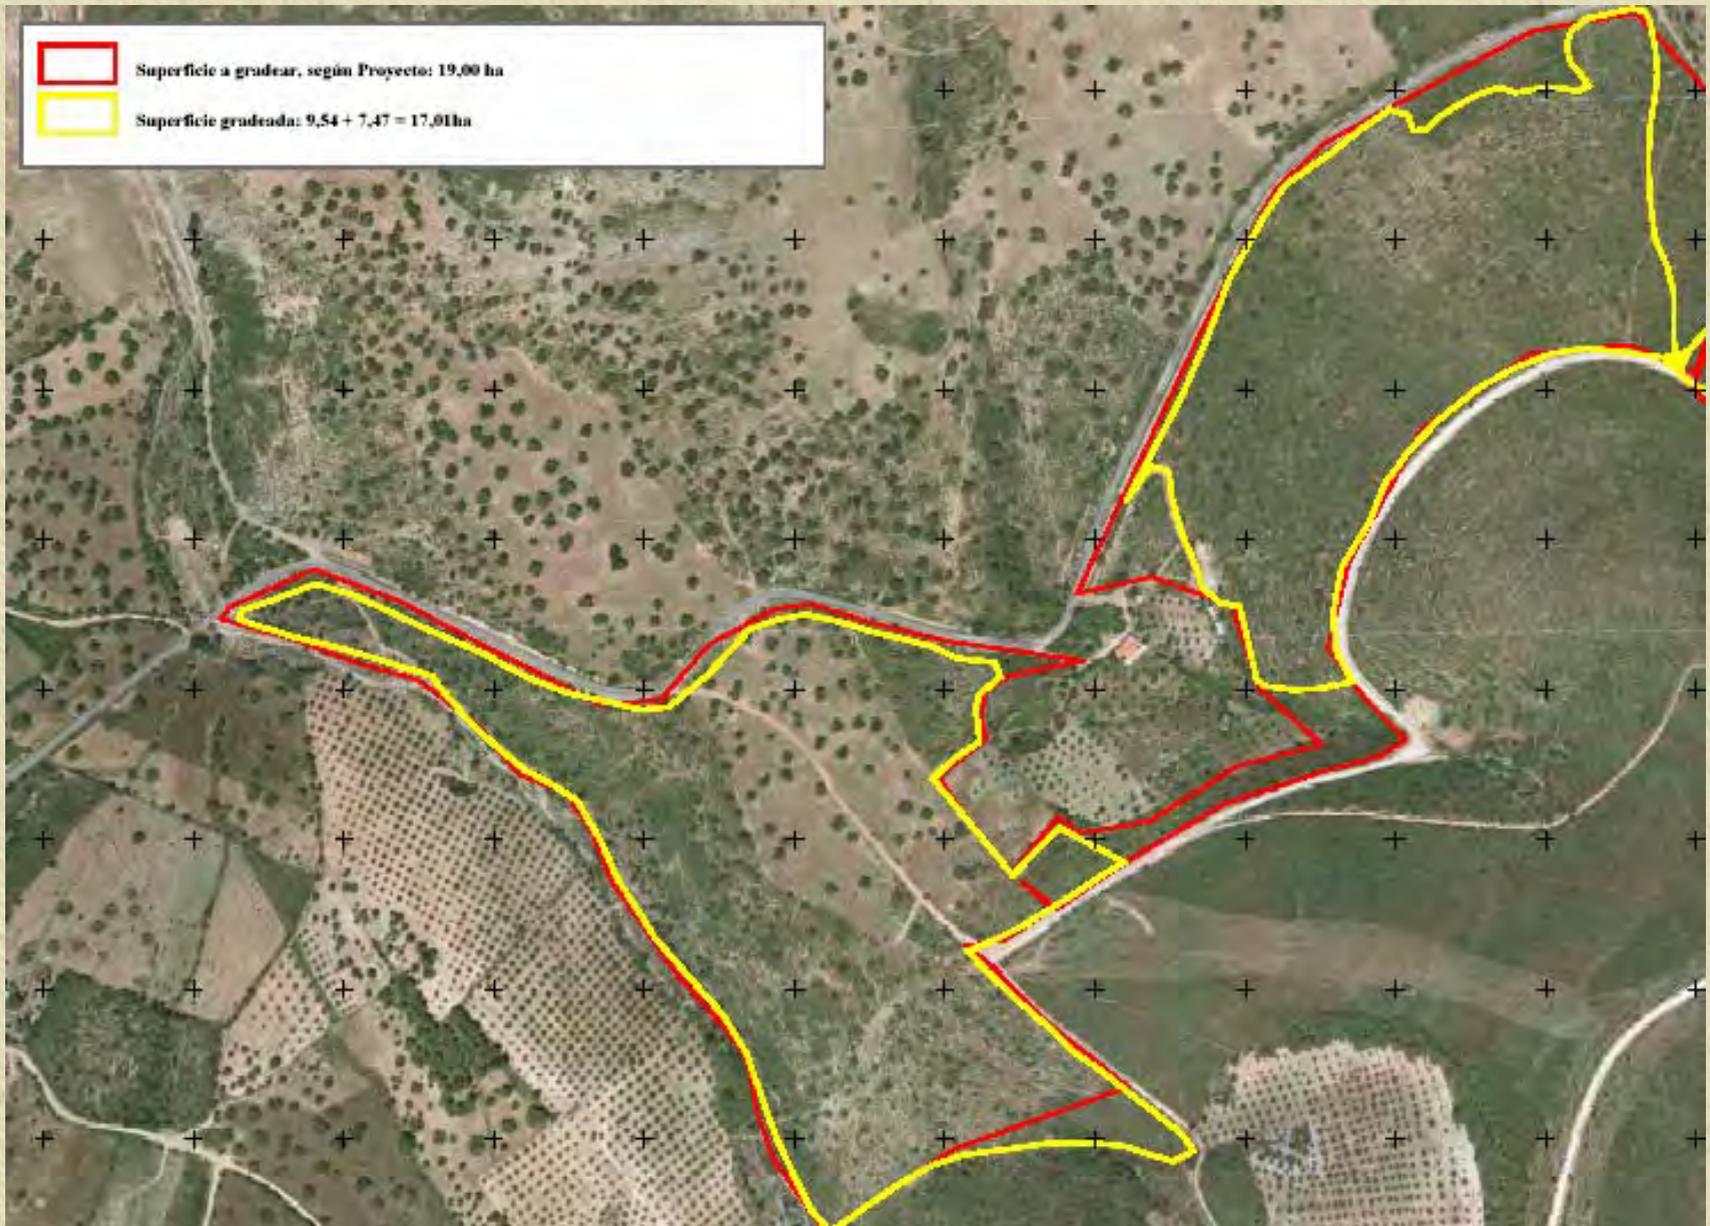

3.- Área Cortafuegos. Sierra del Aljibe.







5.- Monte “Celada A”.

Término Municipal: Siruela y Garlitos



Unidades de Obra ejecutadas:

- *Roza con motodesbrozadora.*
- *Apeo de árboles.*
- *Preparación de madera.*
- *Recogida y apilado de los residuos procedentes de la clara.*
- *Eliminación de los residuos con trituradora de martillos.*
- *Medición ejecutada: 5,25ha (=medición de proyecto)*

6.- Monte “Celada B”.

Término Municipal: Siruela y Garlitos



7.- Monte “Sierra del Palo”.



8.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote Molinillo.

Término Municipal: Herrera del Duque.

Unidades de Obra ejecutadas:

- Roza con motodesbrozadora.*
- Poda de encinas y alcornoques.*
- Apeo de Pinos y Apeo de Eucaliptos.*
- Preparación de la madera de Pinos y Eucaliptos.*
- Recogida y apilado de los residuos generados .*
- Eliminación de los residuos con trituradora de martillos.*
- Medición ejecutada: 16,00ha (=medición de proyecto)*

8.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote Molinillo.

Área Cortafuegos en Zona de Eucaliptos.




8.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote Molinillo.

Área Cortafuegos en Zona de Pinar.



8.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote Molinillo.

Área Cortafuegos en Zona de Pinar.

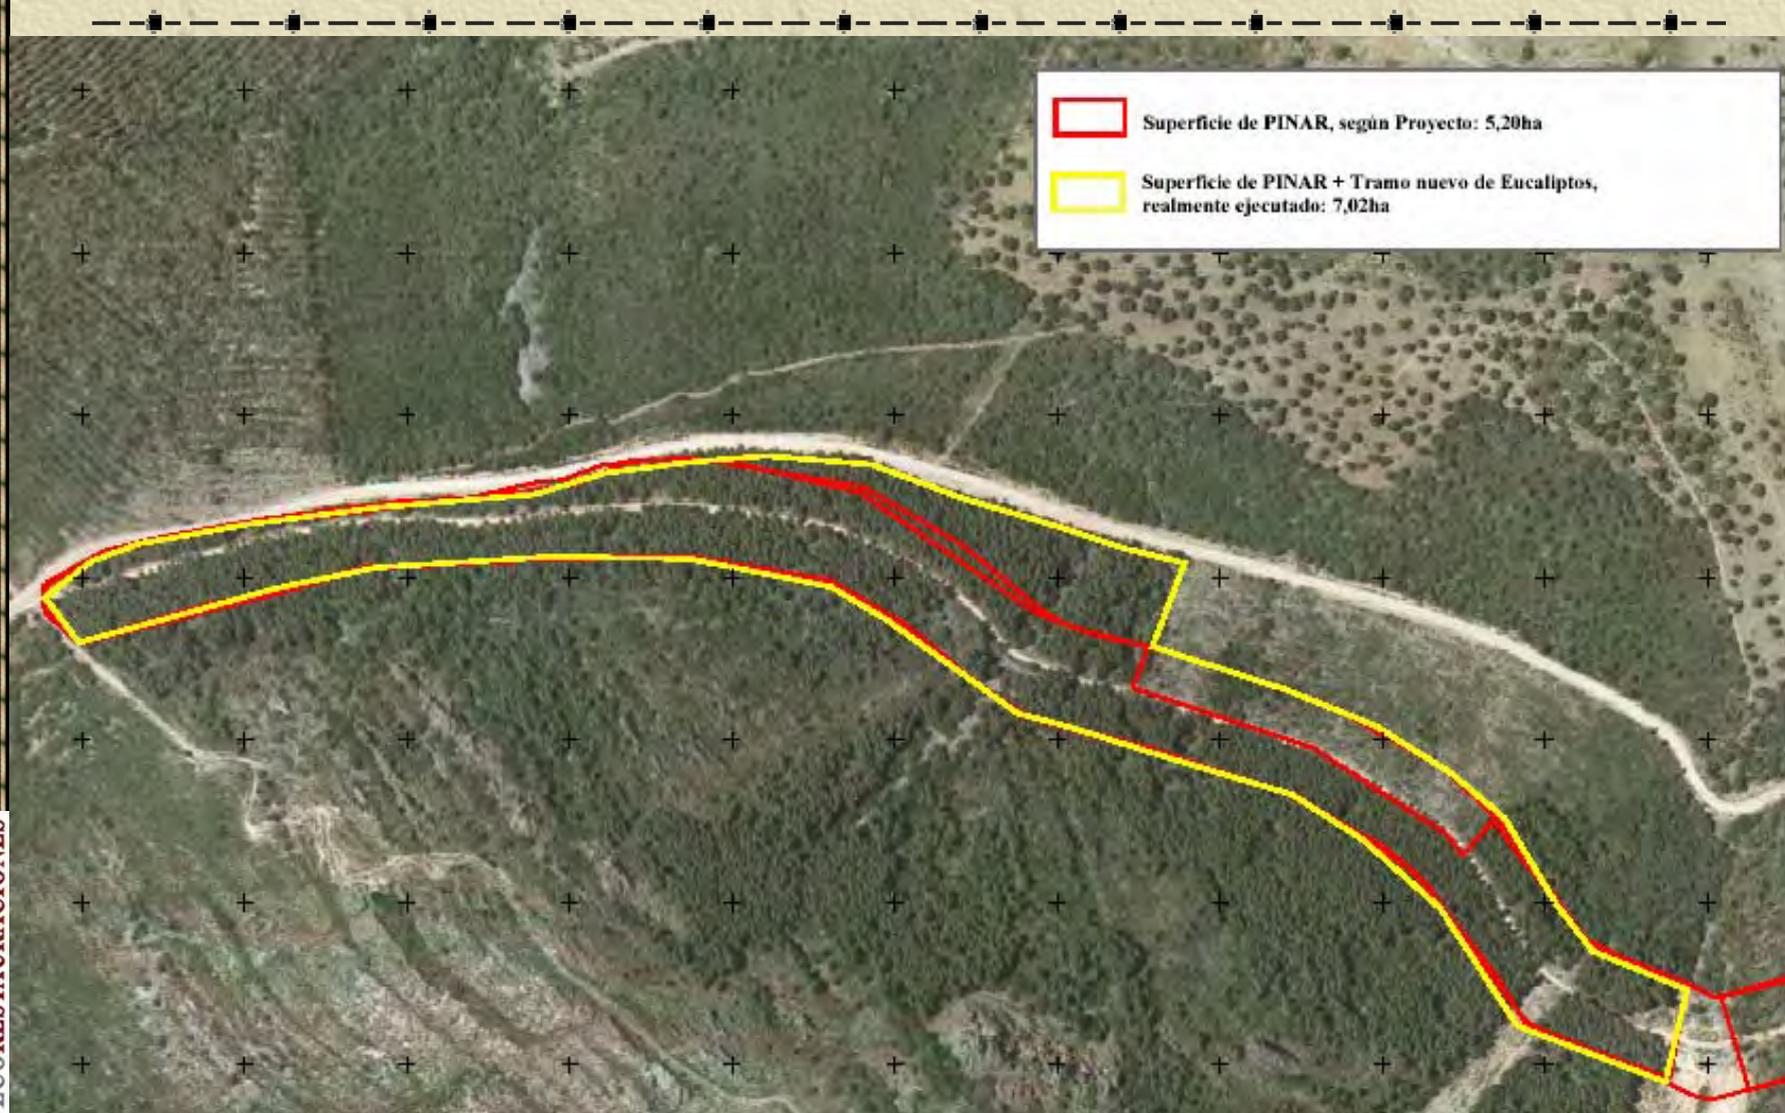

8.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote Molinillo.

Área Cortafuegos en Zona de Matorral.



9.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote El Hoyo.




10.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote El Hoyo.



10.- Monte “Navas y P.Lobo” – Lote El Hoyo.

PARAJE EL POCILLO.

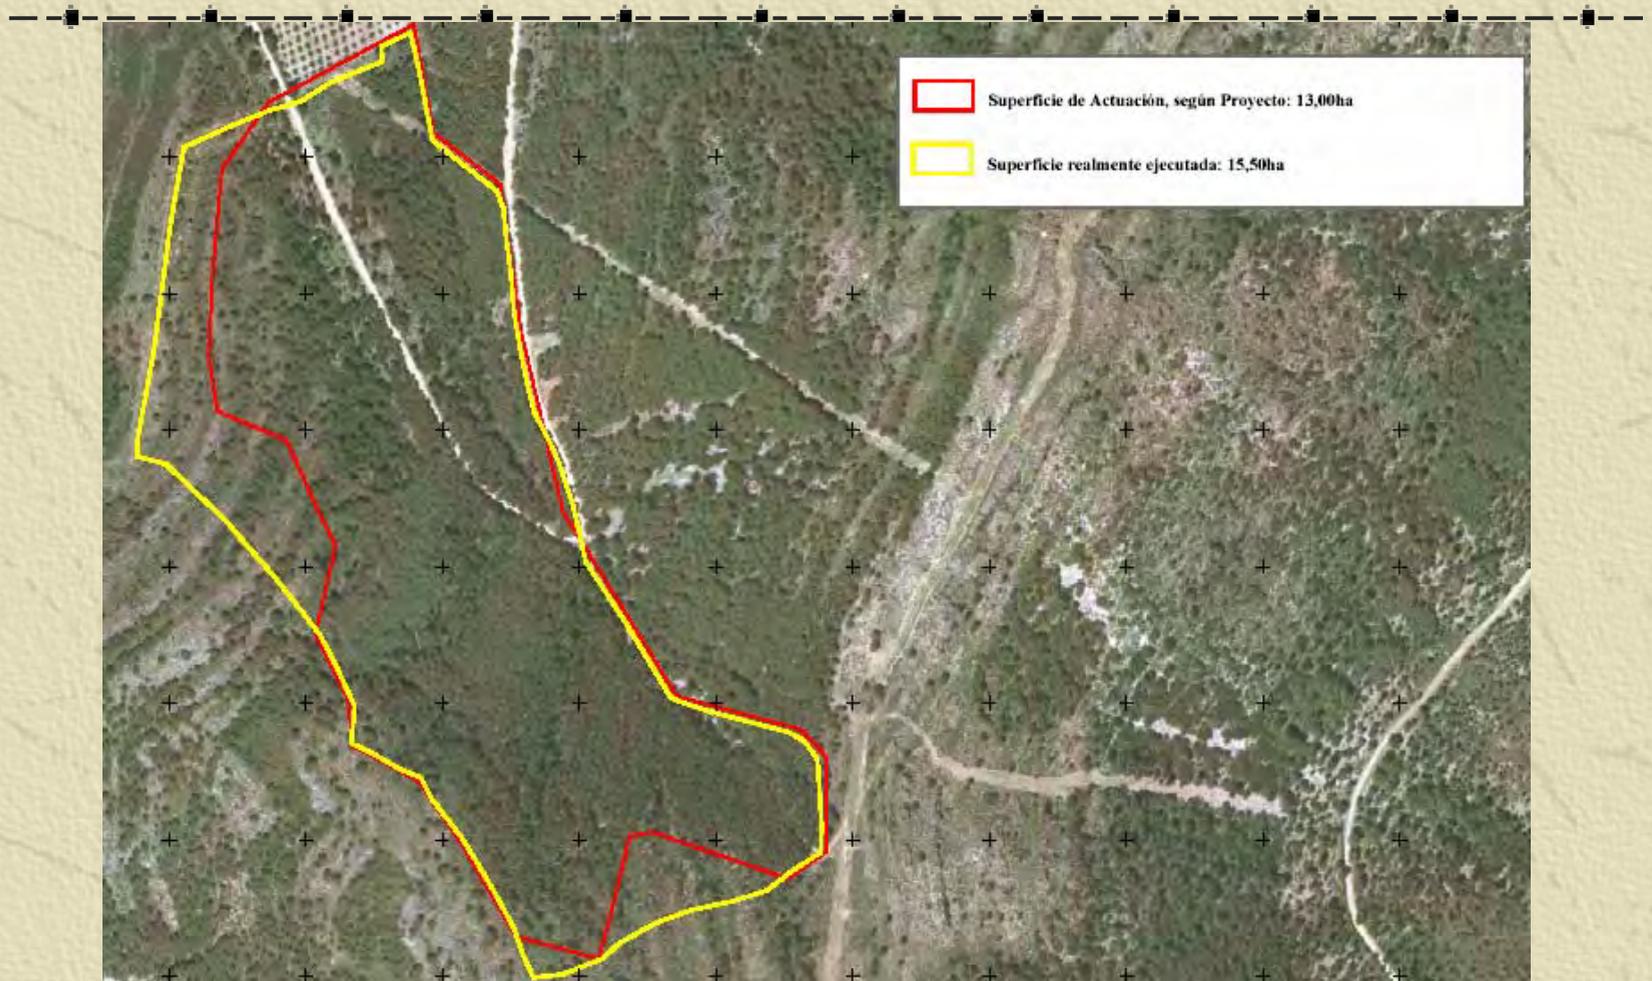

- Medición ejecutada: 15,50ha

11.- Monte “Malcasadillo”.



Cartelería.

Instalación de cartel informativo de Obras

- *Ubicación: Monte Sierra del Aljibe*
- *Dimensiones: 1,95m x 3,00m*



Mejoras Ofertadas.

SACA DE MADERA A CARGADERO

-
- *Ubicación: Montes Celada A y Celada B.*
 - *Superficie: 17ha*



Mejoras Ofertadas.

Equipo de Pronto ataque de Incendios Forestales

- *Ubicación: Montes Molinillo, Celada A y Celada B.*
- *Duración: 2 meses (julio y septiembre de 2010).*

