

**JUNTA DE EXTREMADURA**  
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL  
SERVICIO DE ORDENACION Y GESTION FORESTAL



**Proyecto de Mejora de la cubierta vegetal arbórea y aumento de su defensa frente a incendios en pinares de la Sección Forestal de Badajoz Norte**

**JUNTA DE EXTREMADURA**  
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

 **UNIÓN EUROPEA**  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Viveros  
La Dehesa

## INDICE

- 1.- Antecedentes y objetivos
- 2.- Estado del monte previo a las actuaciones
- 3.- Datos generales del Proyecto
- 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto
- 5.- Listado del personal contratado
- 6.- Cronograma de ejecución de la obra
- 7.- Planos de actuación

## 1.- Antecedentes y objetivos

# 1.- Antecedentes y objetivos

- Montes gestionados por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de Badajoz. Sección Badajoz Norte.
- Proyecto cofinanciado FONDO FEDER.
- Programa Operativo del Plan Forestal de Extremadura. POV 8 Defensa del monte

## MONTE SIERRA de ARRAZAUCES:

Actuación: Roza, poda, clareo y eliminación de restos

POV8.Defensa del monte

Subprograma 8.1:Lucha contra incendios

Actuación TPI: Tratamientos silvícolas preventivas frente a incendios forestales

## MONTE CASARES de ENMEDIO:

Actuación: Roza, poda, clareo y eliminación de restos

POV8.Defensa del monte

Subprograma 8.1:Lucha contra incendios

Actuación TPI: Tratamientos silvícolas preventivas frente a incendios forestales

## MONTE GOLONDRONCILLOS de VALDEGAMAS:

Actuación: Roza, poda, clareo y eliminación de restos

POV8.Defensa del monte

Subprograma 8.1:Lucha contra incendios

Actuación TPI: Tratamientos silvícolas preventivas frente a incendios forestales

## 2.- Estado del monte previo a las actuaciones

## 2.- Estado del monte previo a las actuaciones

- Repoblaciones jóvenes de *Pinus pinea* con tangencia de copas y gran colonización de matorral heliófilo.
- Modelo de combustible 4.
- Objetivo final: Lograr vegetación estable y permanente, en equilibrio con la capacidad de acogida del medio.



### 3.- Datos generales del Proyecto

### 3.- Datos generales del Proyecto

Fecha de aprobación del Proyecto:

Objeto:” **MEJORA CUBIERTA VEGETAL ARBOREA Y AUMENTO DE SU DEFENSA FRENTE A INCENDIOS EN PINARES DE LA SECCION FORESTAL DE BADAJOZ NORTE**”

Nº expediente: **09N1012FD129**

Presupuesto de licitación: **135.249,43 €**

Fecha de adjudicación provisional: **21/09/2009**

Fecha de adjudicación definitiva: **14/10/2009**

Fecha de firma del contrato: **15/10/2009**

Importe de adjudicación: **133.220.69 €**

Plazo de ejecución: **4 meses**

Acta de comprobación de replanteo: **04/11/2009**

Inicio de las obras:**04/11/2009**

Acta de paralización de obra: **No procede**

Acta de reinicio de obra: **No procede**

Fin de las obras: **03/03/2010**

## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

1. Firma de acta de replanteo marcando directrices de actuación.
2. Desbroce matorral mecanizado. Tractor de cadenas provisto de desbrozadora de cadenas
3. Desbroce manual de matorral. Cuadrilla del Valle de la Serena (Badajoz) con desbrozadoras triaspas Sthil 550 , compuesta por 7 peones especialistas y 1 capataz forestal.
4. Poda y clareo del pinar. Cuadrilla del Valle de la Serena (Badajoz) con motosierras Sthil 260, compuesta por 4 peones especialistas y 12 capataz forestal.
5. Recogida y acordonado de restos. Cuadrilla del Valle de la Serena (Badajoz) de peones no especialistas , compuesta por 4 peones y 1 capataz forestal.
6. Astillado de restos. 2 tractores de cadenas provistos de astilladora de cuchillas alimentadas por dos peones especializados cada una de ellas, del Valle de la Serena (Badajoz)

## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

1. Firma de acta de replanteo marcando directrices de actuación.



## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

2.-Desbroce matorral mecanizado. Tractor de cadenas provisto de desbrozadora de cadenas



## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

3.-Desbroce manual de matorral. Cuadrilla del Valle de la Serena (Badajoz) con desbrozadoras triaspas Sthil 550 , compuesta por 7 peones especialistas y 1 capataz forestal.



## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

4.-Poda y clareo del pinar. Cuadrilla del Valle de la Serena (Badajoz) con motosierras Sthil 260, compuesta por 4 peones especialistas y 12 capataz forestal.



## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

5.- Recogida y acordonado de restos. Cuadrilla del Valle de la Serena (Badajoz) de peones no especialistas ,  
compuesta por 4 peones y 1 capataz forestal.



## 4.- Ejecución y desarrollo del Proyecto

6.-Astillado de restos. 2 tractores de cadenas provistos de astilladora de cuchillas alimentadas por dos peones especializados cada una de ellas, del Valle de la Serena (Badajoz)




## 5.- Listado del personal contratado

## 5.- Listado del personal contratado

<b>PERSONAL</b>				
<b>PROCEDENCIA</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>	<b>TRABAJADOR</b>	<b>CATEGORIA</b>
Don Benito	1/11/2009		Martín Solo de Zaldívar, Ramón	INGENIERO de MONTES
Don Benito	1/11/2009		Gómez Parejo, Santiago	CAPATAZ FORESTAL
Garciaz	29/10/2009	30/11/2009	Piñas Serrano, Marcelino	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Carrasco Fernandez, Simon	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Fanjul Fernandez, Francisco	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Morales Palacios, Pedro	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Calzado Fernandez, Manuel	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Gil Teno, Eloy	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Rentero Bravo, David	MOTOSERRISTA
Garciaz	30/10/2009	30/11/2009	Giraldo Martin, Teodoro	MOTOSERRISTA
Valle de la Serena	29/10/2009	3/2/2010	Benitez Hidalgo, Luis	PEON
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Caballero Caballero, Jose Francisco	MOTOSERRISTA
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Caballero Garcia, Pedro	PEON
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Caballero Mendoza, Manuel	MOTOSERRISTA
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Caballero Merino, Jose Francisco	MOTOSERRISTA
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Davila Perez, Juan Antonio	MOTOSERRISTA
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Gonzalez Godoy, Jesus	PEON
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Mateos Conde, Antonio	MOTOSERRISTA
Valle de la Serena	30/10/2009	3/2/2010	Salamanca Caballero, Juan Jose	PEON
Valle de la Serena	9/11/2009	3/2/2010	Leon Caballero, Jose	PEON
Valle de la Serena	9/11/2009	3/2/2010	Mateos Caballero, Manuel	PEON
Valle de la Serena	9/11/2009	3/2/2010	Tamayo Lopez, Jose Manuel	PEON
Valle de la Serena	19/11/2009	3/2/2010	Caballero Caballero, Bernardo	PEON
Valle de la Serena	19/11/2009	3/2/2010	Ropero Gonzalez, Fernando	PEON
<b>MAQUINARIA</b>				
<b>PROCEDENCIA</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>		
Valle de la Serena	1/11/2009	28/2/2010	Juan Ayuso Torres	Tractor cadenas con desbrozadora
Valle de la Serena	1/11/2009	28/2/2010	Juan Ayuso Torres	Tractor cadenas con astilladora
Valle de la Serena	1/11/2009	28/2/2010	Juan Ayuso Torres	Tractor cadenas con astilladora
90 % del personal corresponde a la zona de La Serena				

## 6.- Cronograma de ejecución de la obra


## 6.- Cronograma de ejecución de la obra

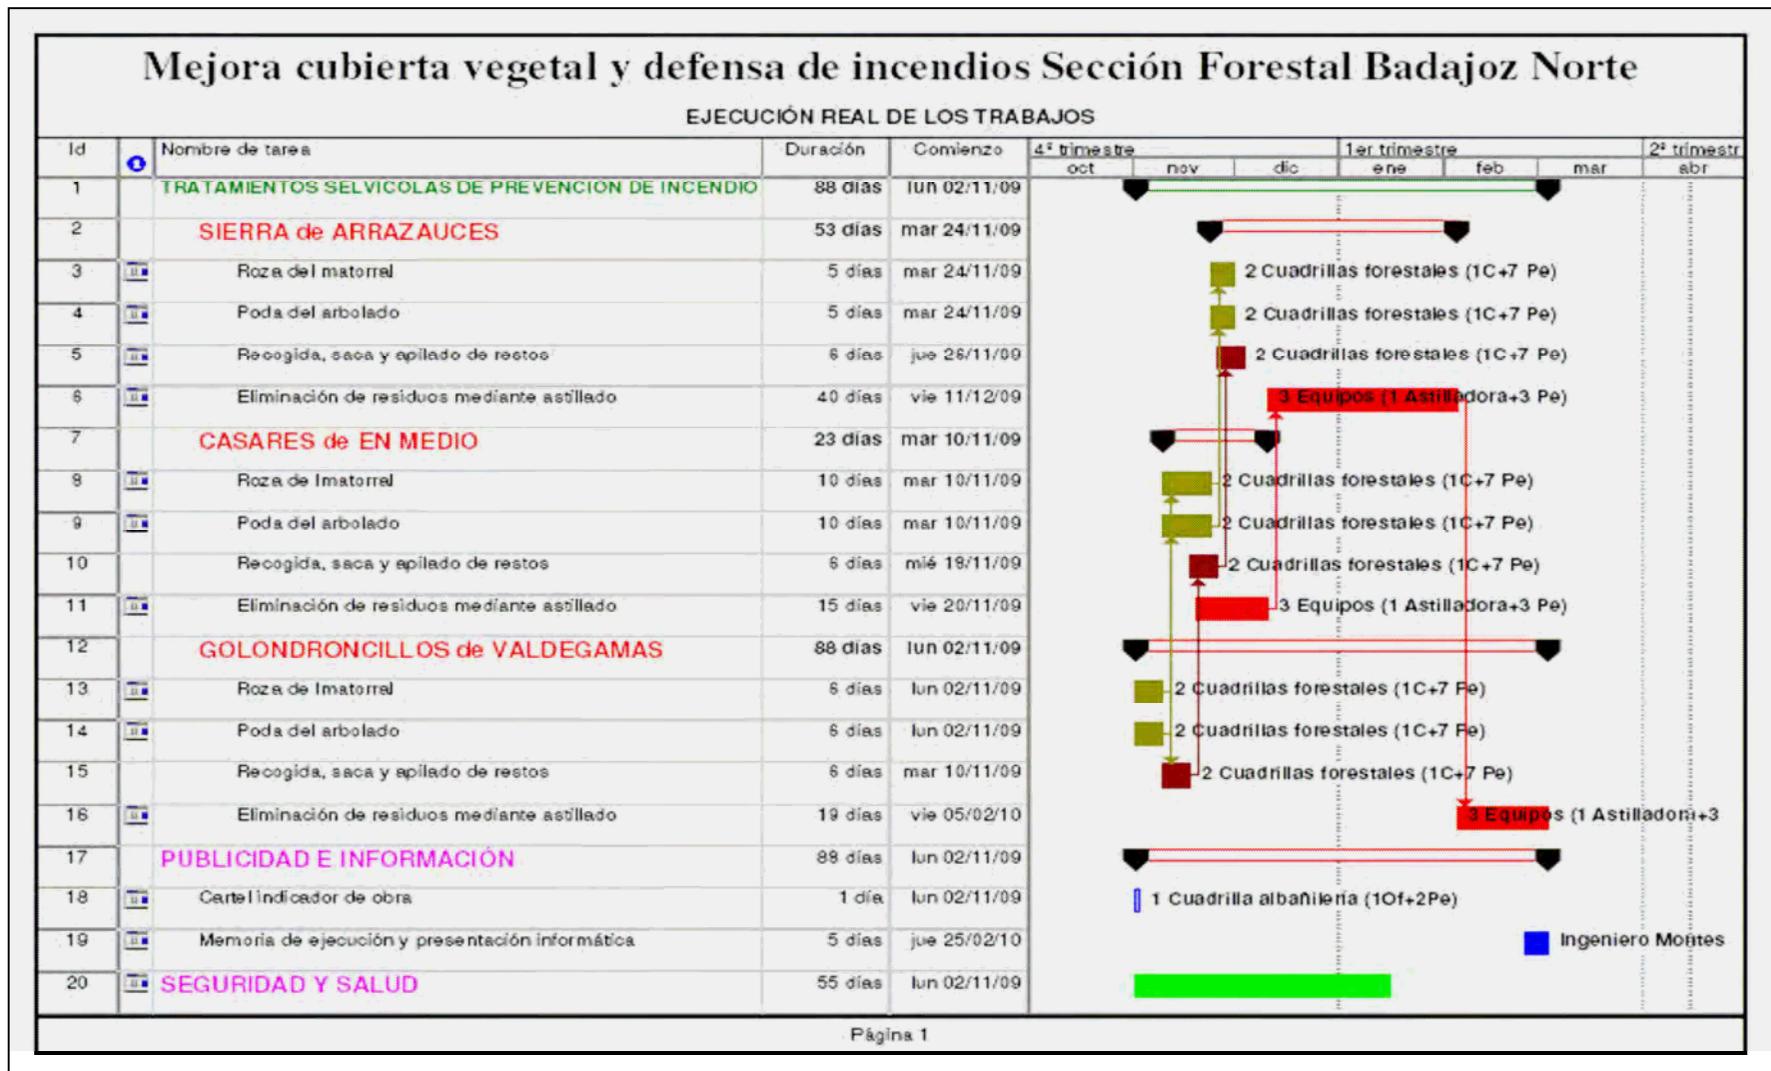


## 7.- Planos de actuación

## 7.- Planos de actuación



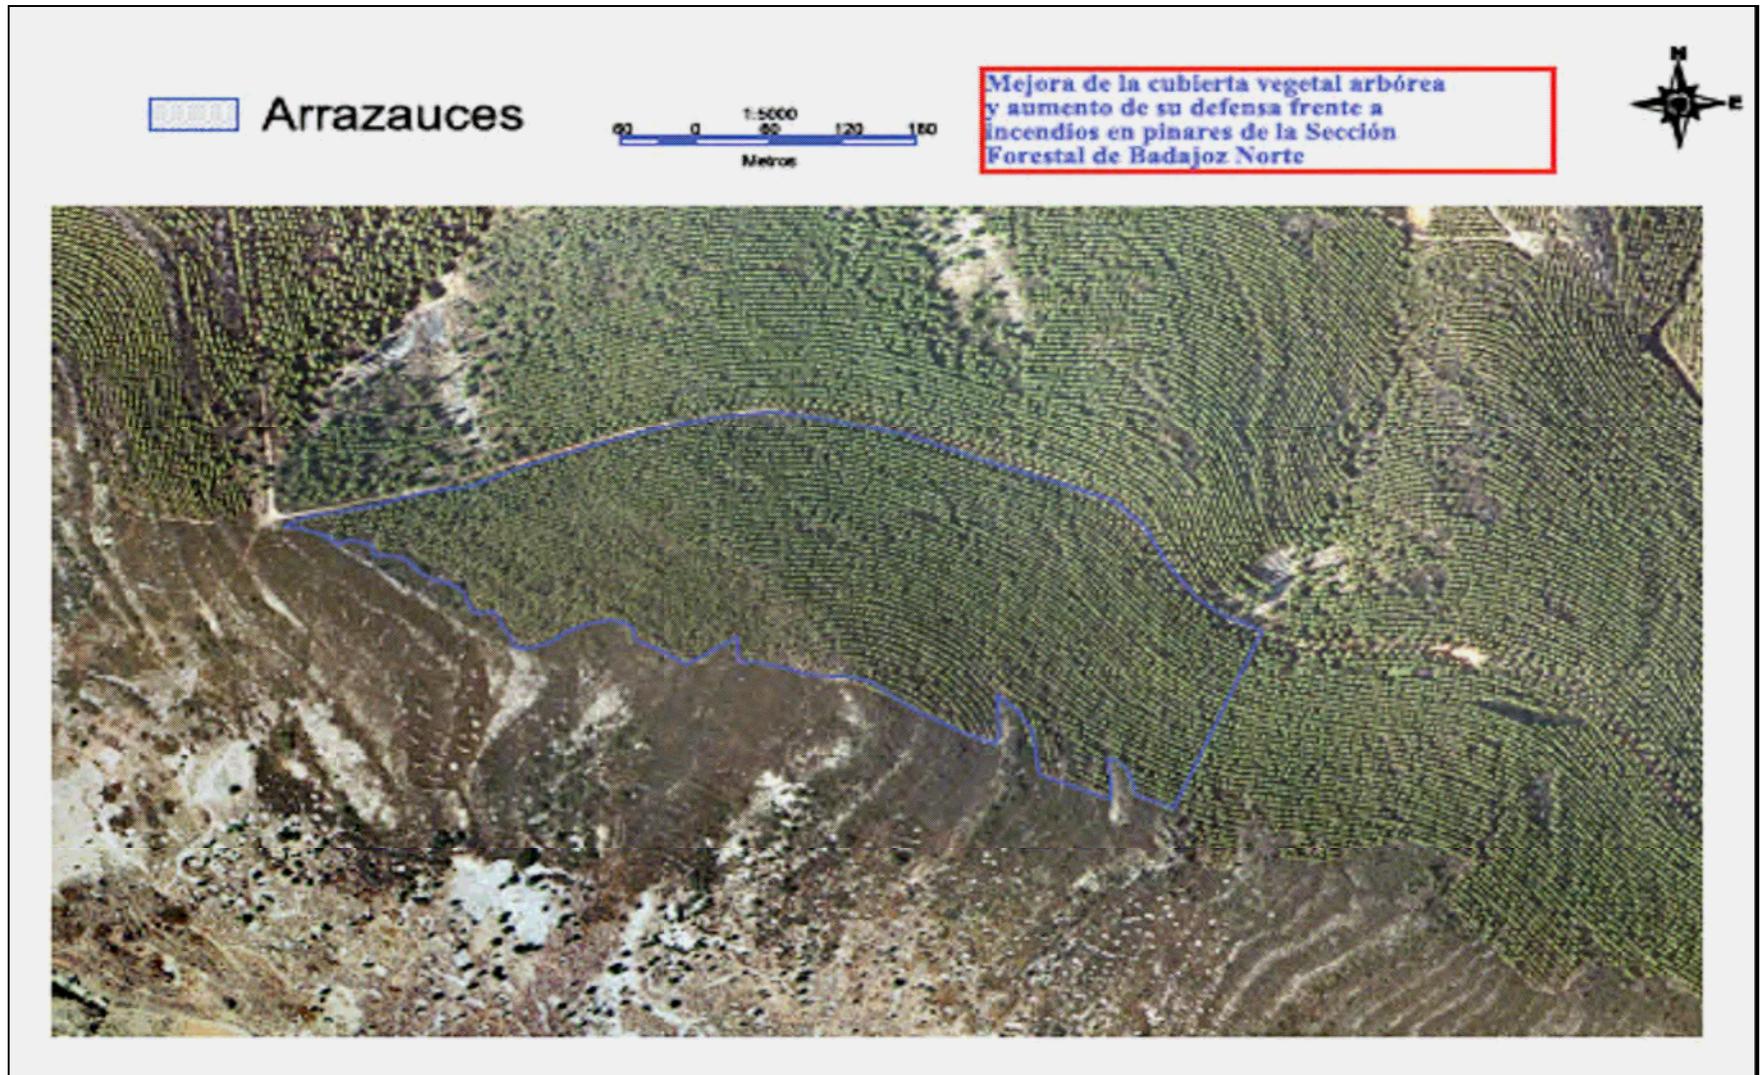

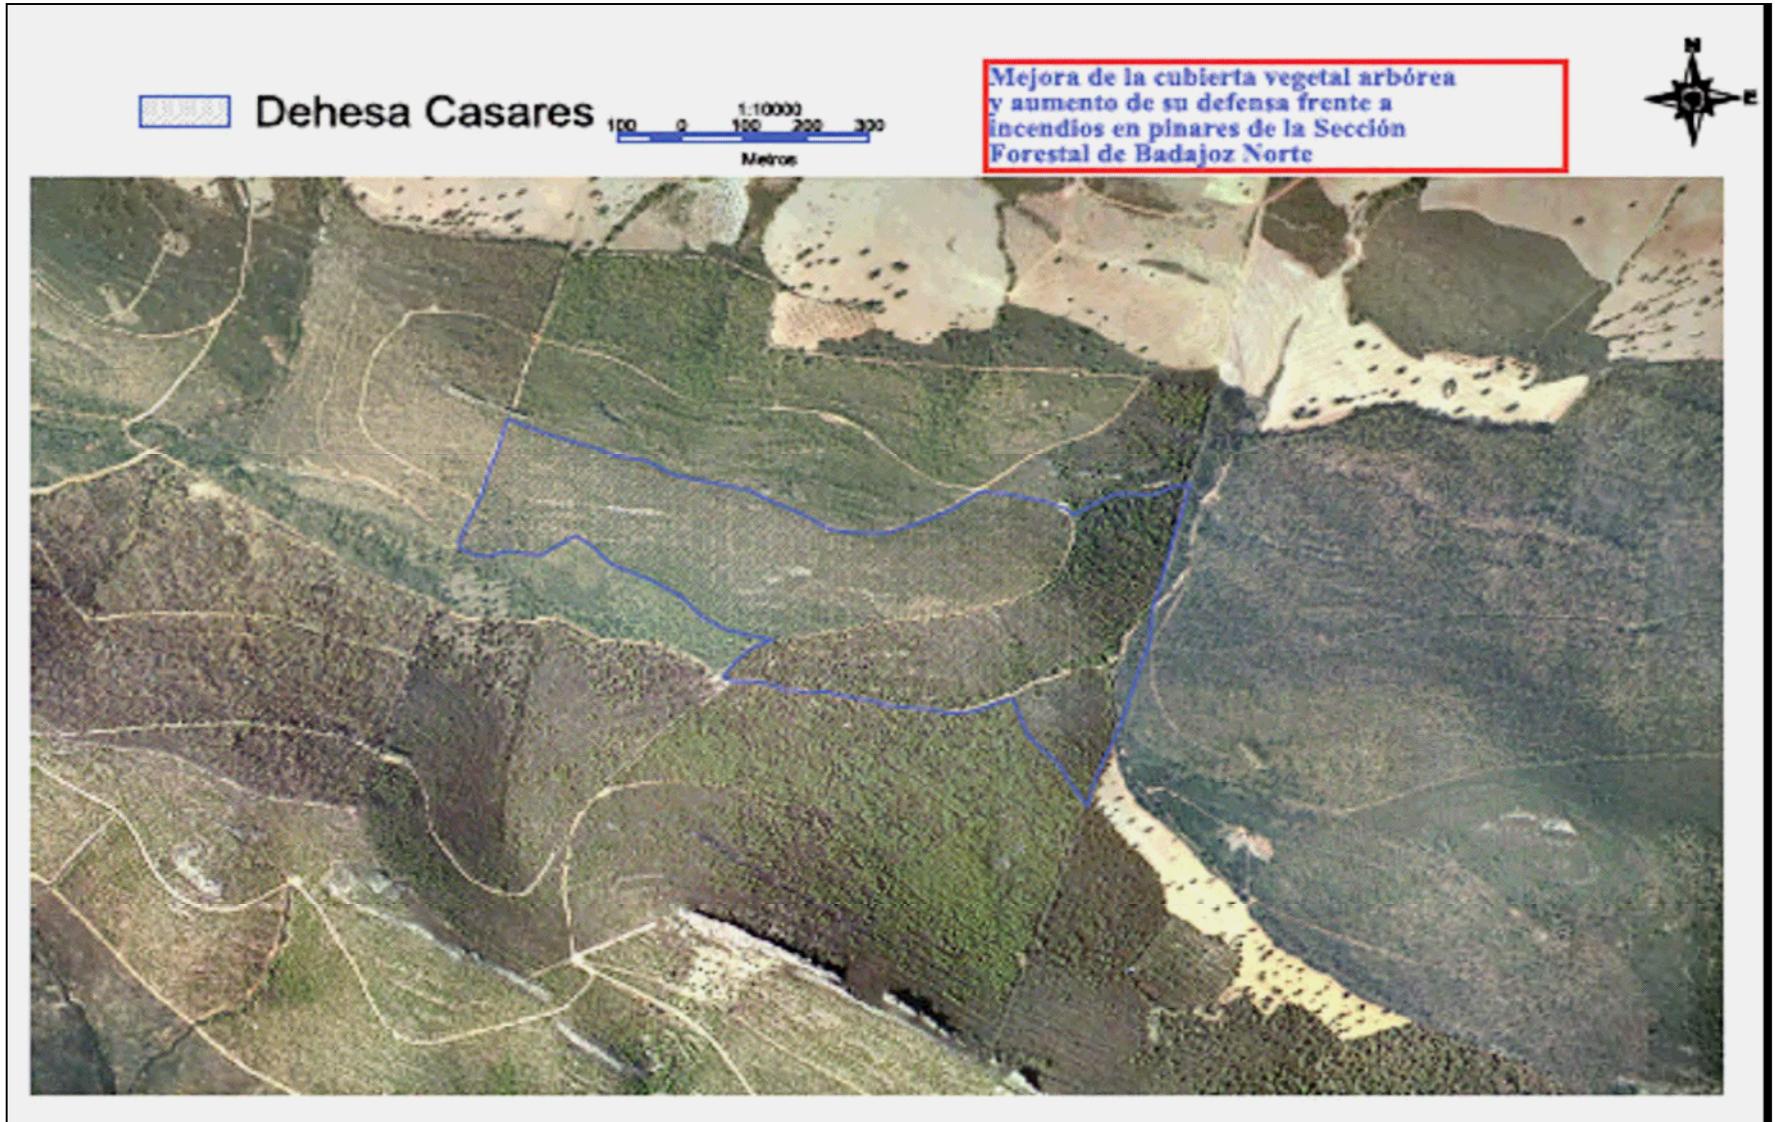

 Valdegamas



Mejora de la cubierta vegetal arbórea  
y aumento de su defensa frente a  
incendios en pinares de la Sección  
Forestal de Badajoz Norte



