


**“PROYECTO DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL
ECOSISTEMA DE DEHESA EN MONTES PÚBLICOS DEL
VALLE DEL ALAGÓN”.**
EXPTE: 10N1011FD027

**JUNTA DE EXTREMADURA, CONSERJERIA DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**



1. OBJETIVO DEL PROYECTO

- - Lucha contra la erosión y desertificación.
- - Mantenimiento del buen estado silvícola de las masas forestales a funciones ecológicas.
- - Prevención de los incendios forestales.
- - Conservación y mejora de la diversidad biológica, el paisaje y los hábitats naturales.
- - Regeneración y rejuvenecimiento de las masas arboladas ralas y envejecidas, especialmente las dehesas.
- - Fomentar el sector Forestal y el empleo rural.

2. SUPERFICIES AFECTADAS

MONTE	Nº	T.M.
Dehesa Boyal y Hondo de Valdelacanal	103 U.P.	Aceituna
Mínguez	105 U.P.	Coria
Dehesa Boyal	106 U.P.	Guijo de Galisteo
Dehesa Boyal	109 U.P.	Montehermoso
Dehesa Boyal	113 U.P.	Santibañez El Bajo
Dehesa Boyal	116 U.P.	Torrejoncillo
Navas Altas	147 U.P.	Cañaverál
Navas de Abajo	148 U.P.	Cañaverál

3. ACTUACIONES GENERALES

- Rozas con motodesbrozadora
- Rozas mecanizadas con tractor de ruedas y cadenas.
- Repaso de cortafuegos
- Apertura de cortafuegos
- Guía y apostado de *Quercus* sp.
- Instalación de cartel de obra
- Redacción de memoria de ejecución y presentación informática

PRESUPUESTO


Concepto	Importe Euros	
CAPITULO MUP 103 "DEHESA BOYAL Y HONDO DE VALDELACANAL", T.M. Aceituna	4.155,52	
CAPITULO MUP 105 "MÍNGUEZ", T.M. Coria	14.270,93	
CAPITULO MUP 106 "DEHESA BOYAL", T.M. Guijo de Galisteo	15.371,01	
CAPITULO MUP 109 "DEHESA BOYAL", T.M. Montehermoso	95.900,75	
CAPITULO MUP 113 "DEHESA BOYAL", T.M. Santibañez el Bajo	36.331,42	
CAPITULO MUP 116 "DEHESA BOYAL", T.M. Torrejuncillo	3.518,17	
CAPITULO MUP 147 "NAVAS ALTAS", T.M. Cañaveral	22.121,39	
CAPITULO MUP 148 "NAVAS DE ABAJO", T.M. Cañaveral	23.111,90	
CAPÍTULO CARTEL DE OBRA	660,00	
MEMORIA Y PRESENTACIÓN	606,00	
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD	287,39	
SUBTOTAL		216.334,48
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19 %)		41.103,55
SUBTOTAL		257.438,03
COEF. ADJUDICACIÓN	0,82049998595	211.227,90
BASE IMPONIBLE		211.227,90
I.V.A. (8 %)		16.898,23
TOTAL		228.126,13

MINGUEZ (T.M. CORIA)

M.U.P. 105 "MINGUEZ"


Apertura de cortafuegos	Ha	12,83
Gradeo de cortafuegos en terrenos complicados	Ha	10,17
Apertura de cortafuegos manual con motodesbrozadora	Ha	3,60
Apostado de matas de Quercus sp.	Pie	500

PLANO DE ACTUACIÓN

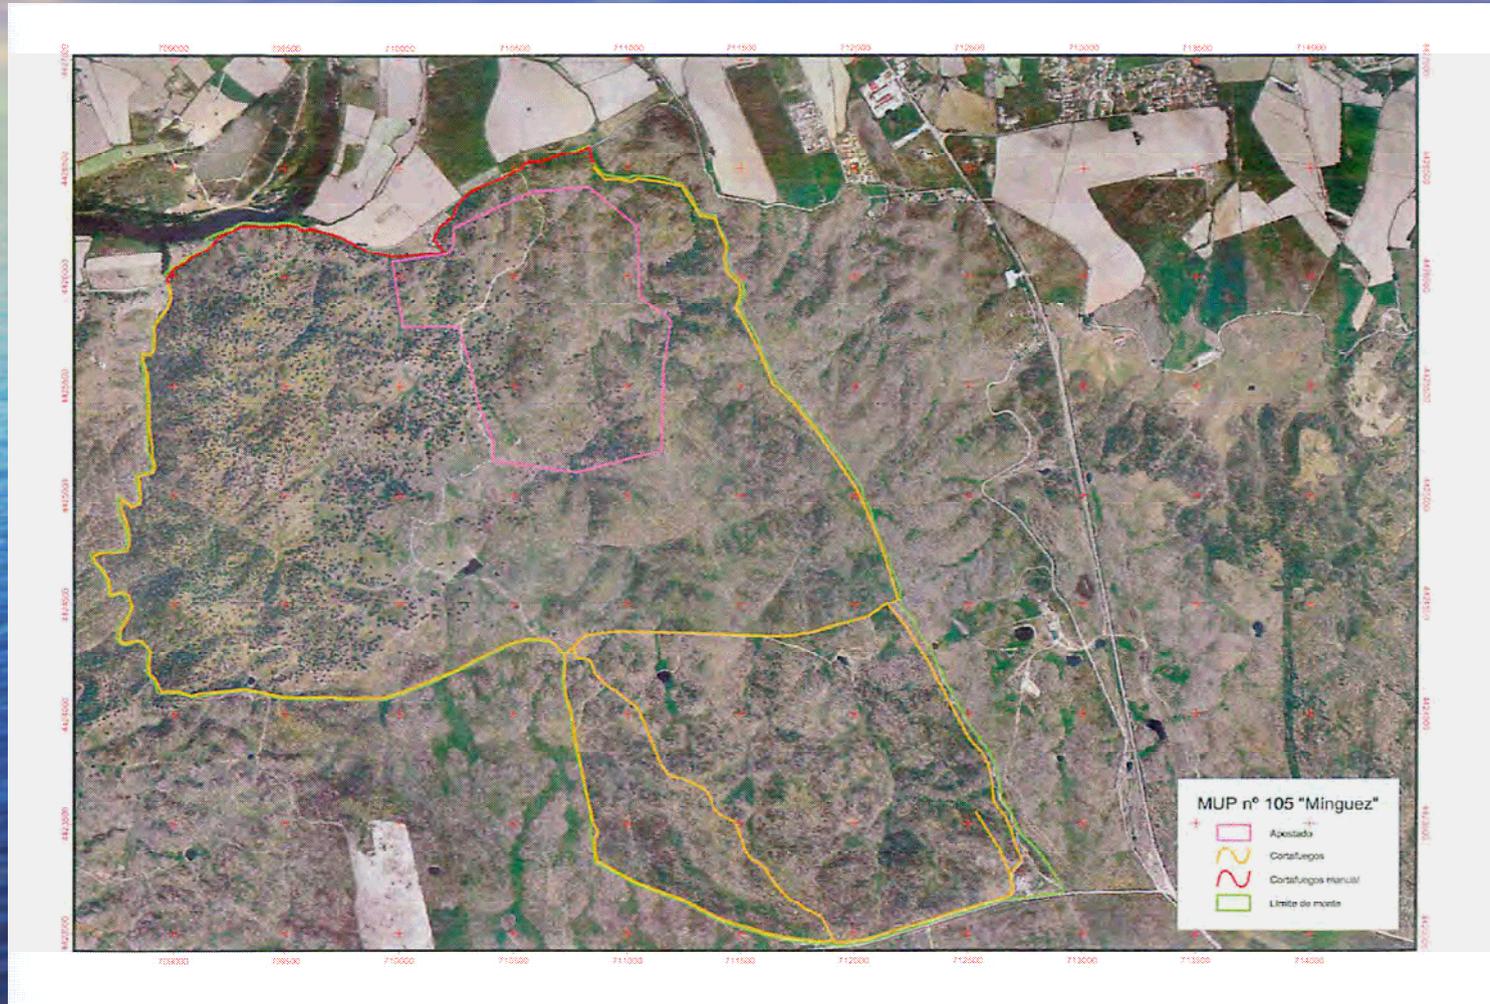

Apertura manual de cortafuegos con motodesbrozadora

Esta actuación se realizó en una superficie de 3,60 ha, mediante motodesbrozadora provista con cuchilla picadora.

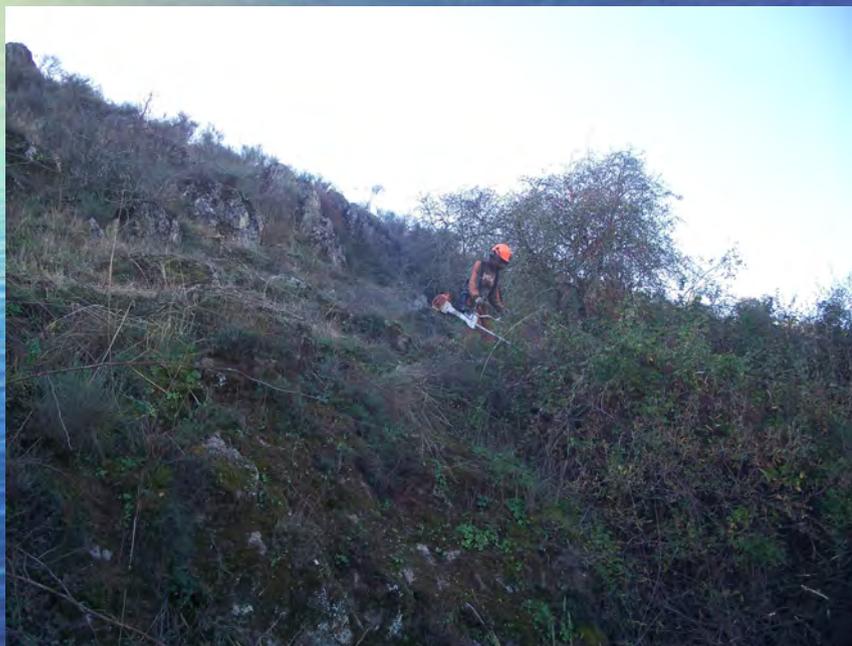

Guía y apostado de *Quercus* sp

Esta actuación se realizó en 500 pies de encina, mediante motosierra, en la dehesa Mínguez



Apertura de cortafuegos con Búldozer

Esta actuación se realizó en 12,83 ha, mediante tractor de cadenas



Repaso de cortafuegos en terrenos complicados

Esta actuación se realizó en 12,17 ha, mediante tractor de cadenas




DEHESA BOYAL Y HONDO DE VALDELACANAL (T.M. ACEITUNA)

M.U.P. 103 DEHESA BOYAL Y HONDO DE VALDELACANAL

Gradeo de cortafuegos	Ha	16,30
-----------------------	----	-------

PLANO DE ACTUACIÓN

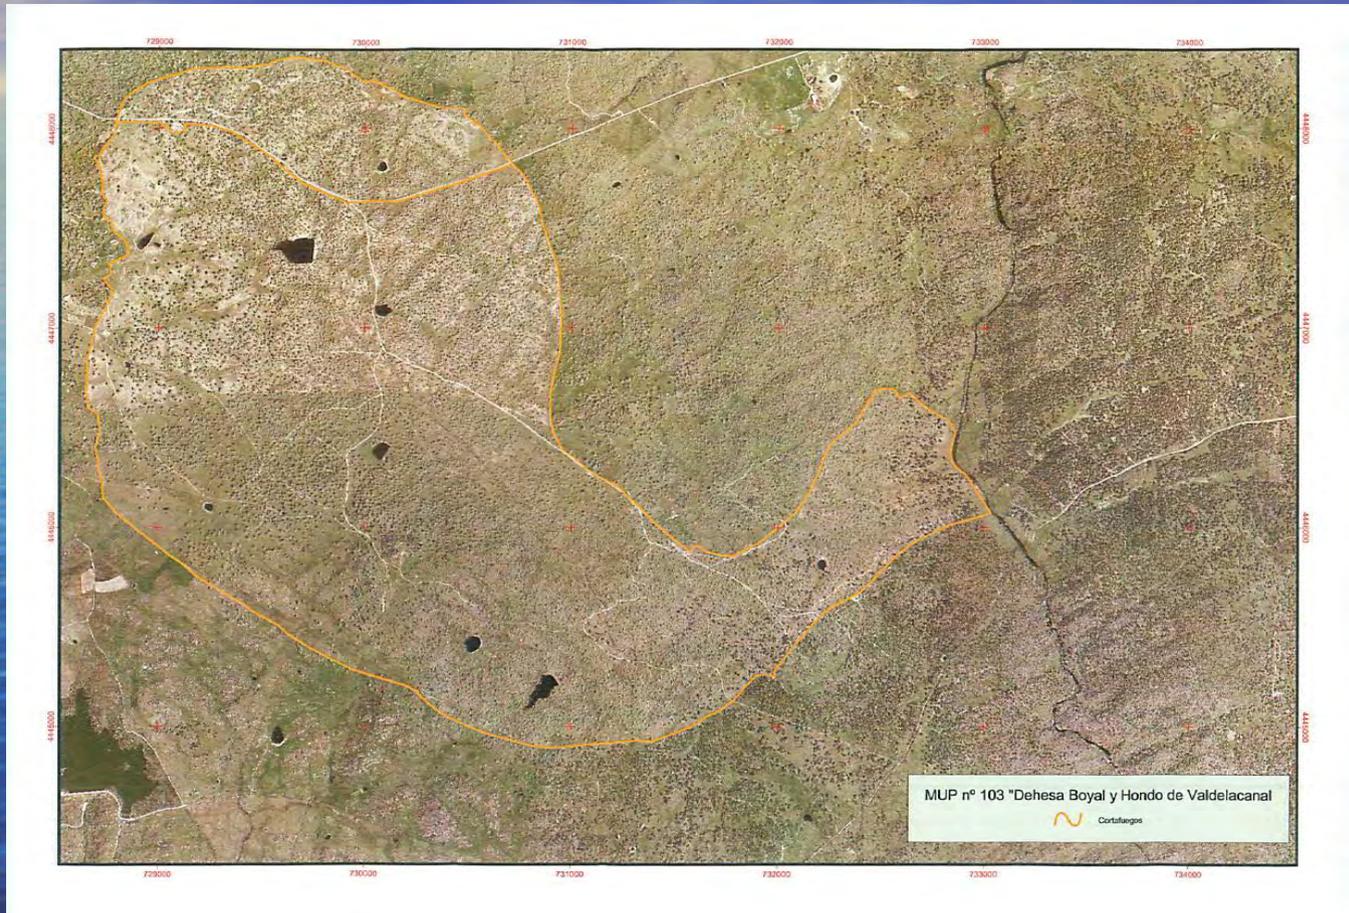

Repaso de cortafuegos

Esta actuación se realizó en 16,30 ha, mediante tractor de ruedas




DEHESA BOYAL (T.M. GUIJO DE GALISTEO)

M.U.P. 106 DEHESA BOYAL

Roza mecanizada	Ha	30,00
Gradeo de cortafuegos en terrenos complicados	Ha	21,44

PLANO DE ACTUACIÓN

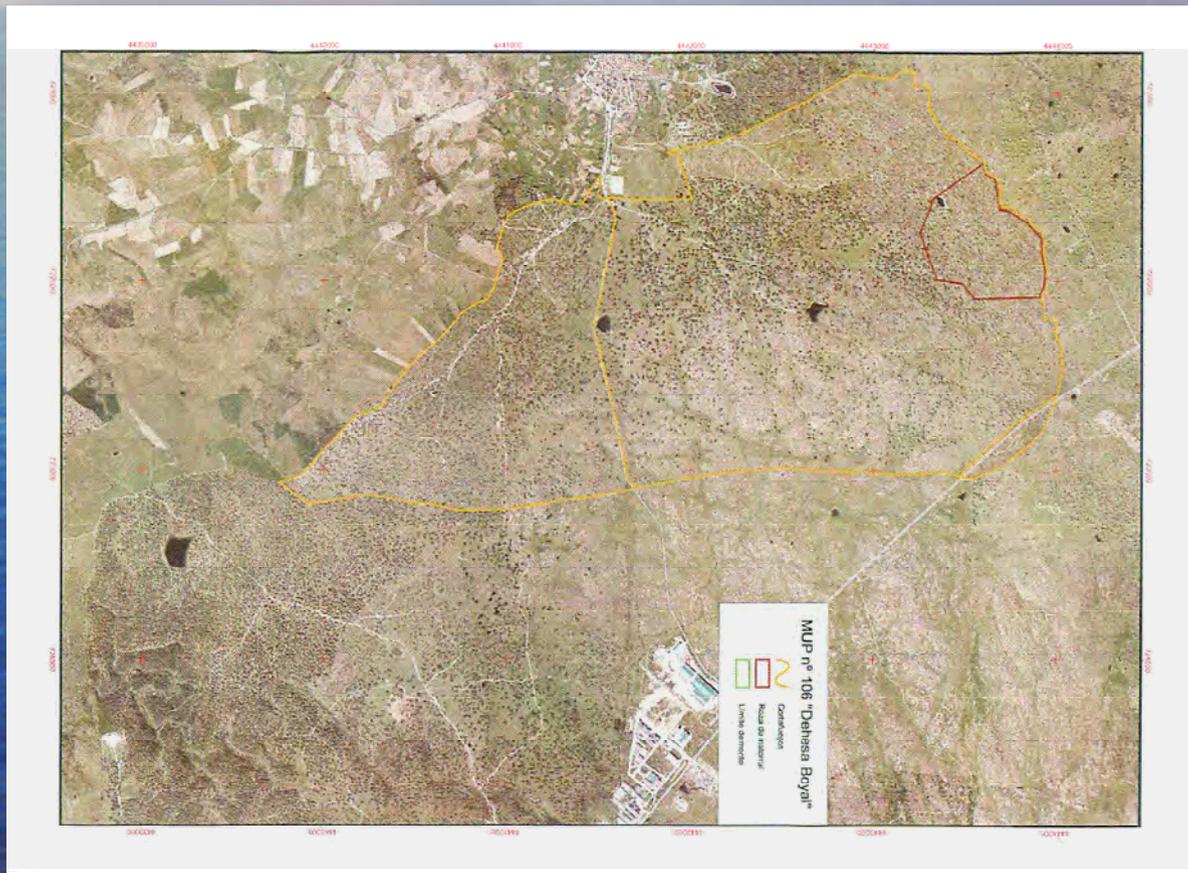

Repaso de cortafuegos

Esta actuación se realizó en 21,44 ha, mediante tractor de ruedas



Roza mecanizada

Esta actuación se realizó en 30 ha, mediante tractor de cadenas




DEHESA BOYAL (T.M. MONTEHERMOSO)

M.U.P. 109 "DEHESA BOYAL"

Roza mecanizada con tractor de cadenas	Ha	100,00
Gradeo de cortafuegos	Ha	30,59
Roza manual con motodesbrozadora	Ha	54,00

PLANO DE ACTUACIÓN

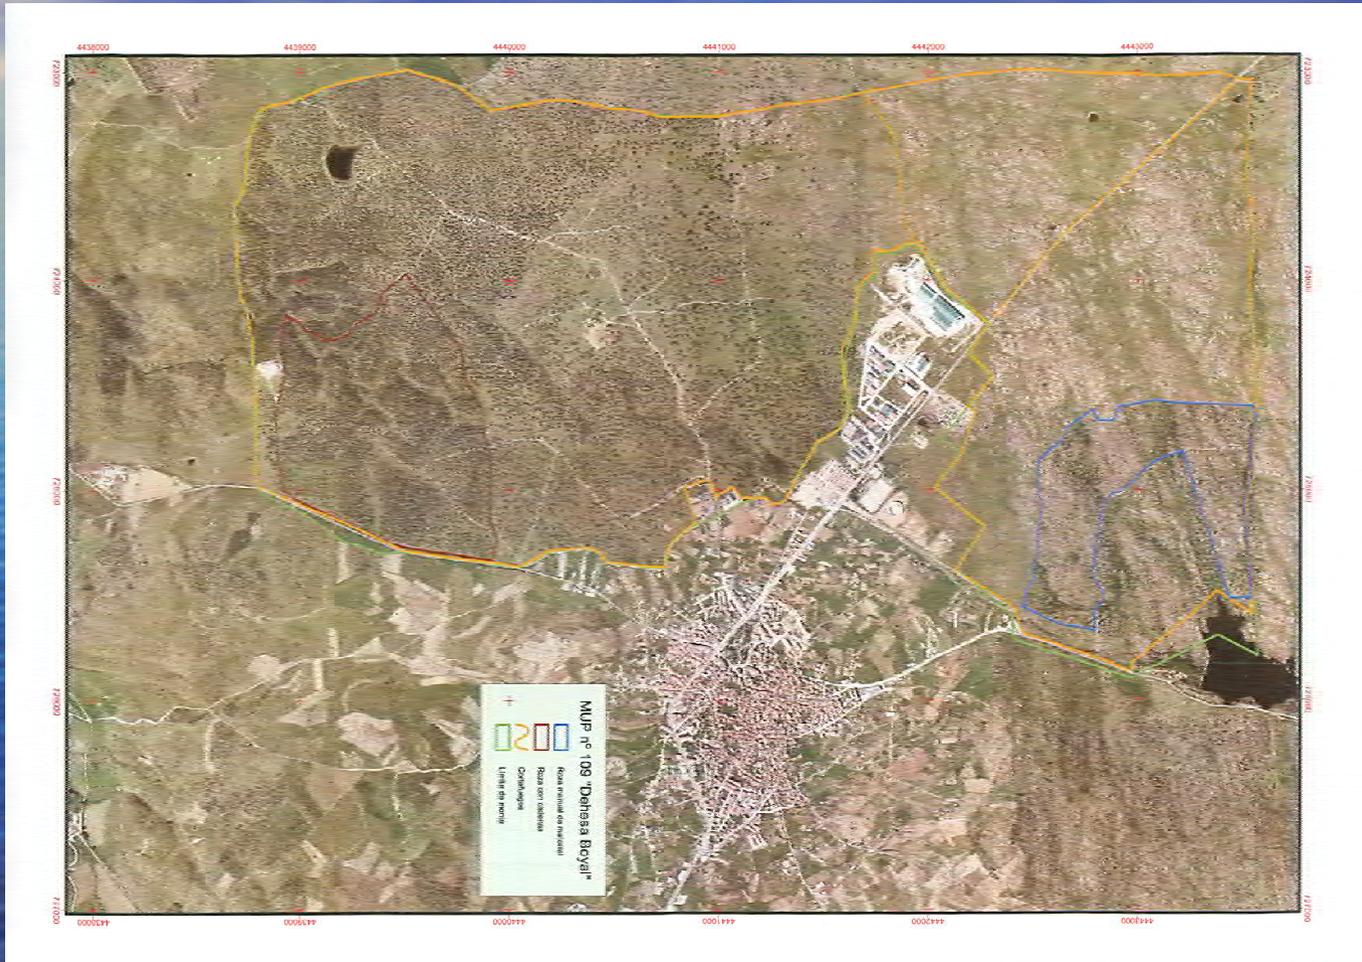

Roza mecanizada

Esta actuación se realizó en 100 ha, mediante tractor de ruedas



Roza manual

Esta actuación se realizó en 54 ha, mediante motodesbrozadora manual dotadas de cuchilla picadora



Repaso de cortafuegos

Esta actuación se realizó en 30,59 ha, mediante tractor de ruedas




DEHESA BOYAL (T.M. SANTIBAÑEZ EL BAJO)

M.U.P. 113 "DEHESA BOYAL"

Roza mecanizada con tractor de cadenas	Ha	84,00
Gradeo de cortafuegos	Ha	20,66
Construcción de charcas 3.500 m ³	Ud	2,00

PLANO DE ACTUACIÓN

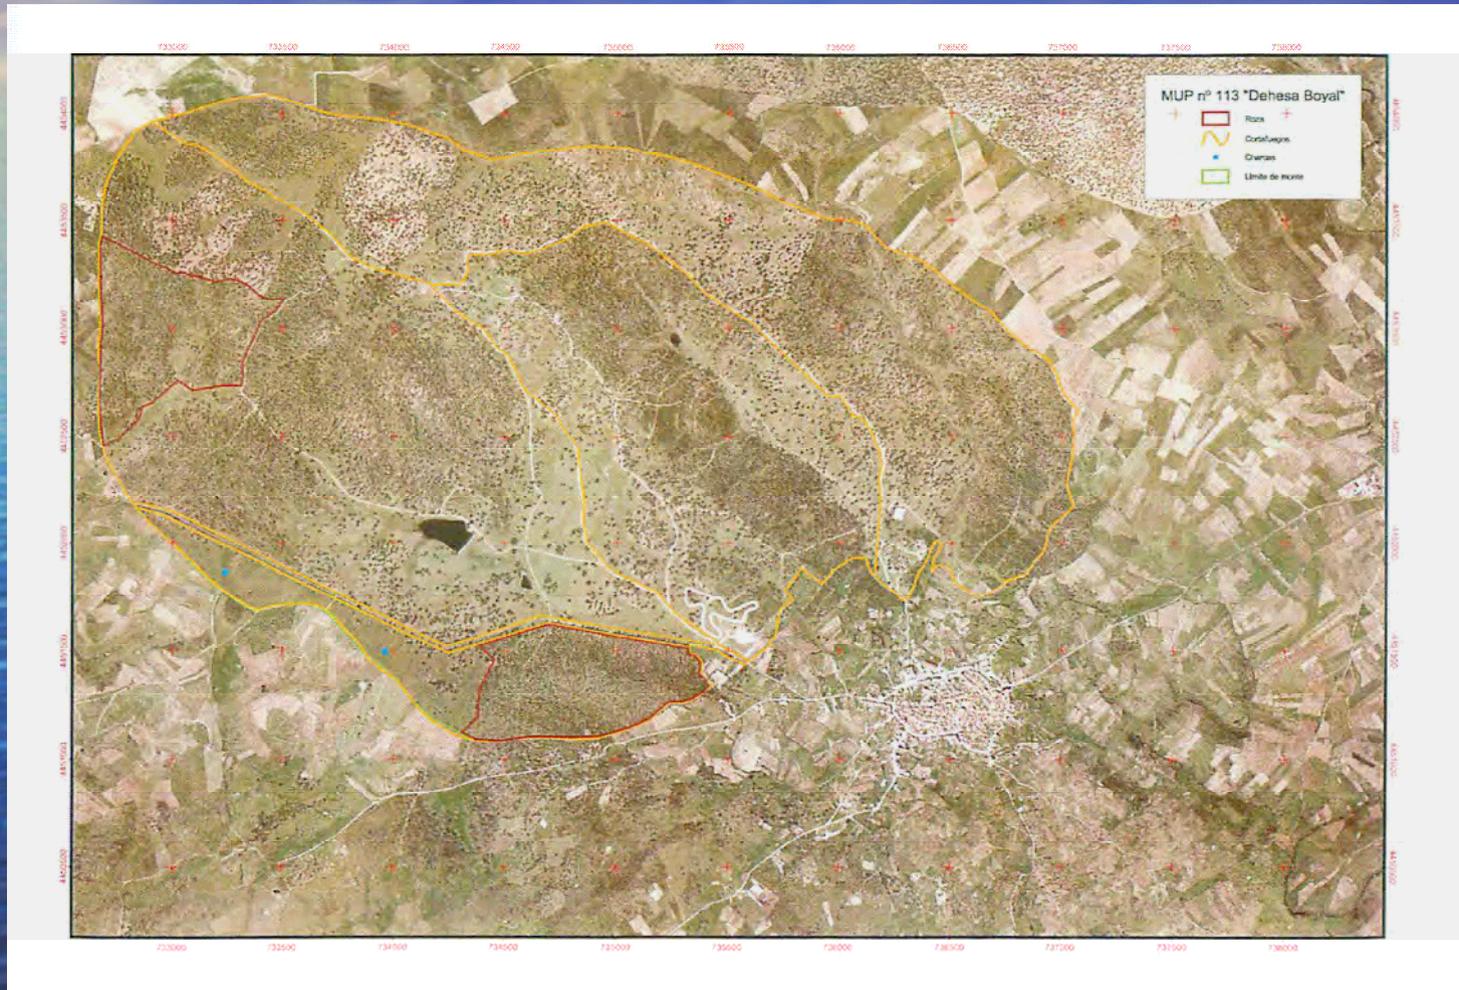

Roza mecanizada

Esta actuación se realizó en 84 ha, mediante tractor de ruedas



Repaso de cortafuegos

Esta actuación se realizó en 20,66 ha, mediante tractor de ruedas



Construcción de 2 charcas

Esta actuación se realizó con retroexcavadora de 140 CV.



DEHESA BOYAL (T.M. TORREJONCILLO)

M.U.P. 116 "DEHESA BOYAL"

Gradeo de cortafuegos	Ha	13,80
-----------------------	----	-------

PLANO DE ACTUACIÓN



Repaso de cortafuegos

Esta actuación se realizó en 13,80 ha, mediante tractor de ruedas



NAVAS ALTAS (T.M. CAÑAVERAL)

M.U.P. 147 "NAVAS ALTAS"

Roza mecanizada con
tractor de cadenas

Ha

67,00

PLANO DE ACTUACIÓN



Roza mecanizada

Esta actuación se realizó en 67 ha, mediante tractor de cadenas



NAVAS DE ABAJO (T.M. CAÑAVERAL)

M.U.P. 148 "NAVAS DE ABAJO"

Roza mecanizada con
tractor de cadenas

Ha

70,00

PLANO DE ACTUACIÓN



Roza mecanizada

Esta actuación se realizó en 67 ha, mediante tractor de cadenas



CARTEL DE OBRA



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente

Protección y Restauración del
Ecosistema de Dehesa en Montes
Públicos del Valle de Alagón.

Expediente: IONIOIIFD027
Inversión: 228.126,13 €

Contratista:  **sefoex**
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIÓN S.A.

 **UNIÓN EUROPEA**
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"

MEJORAS

1. Poda de pies de Quercus sp. de ramas secas, en dehesa de Montehermoso.
2. Corta y retirada de pies secos de encina en Navas Altas, Cañaveral.
3. Desbroce manual en zonas de regenerado en dehesa de Montehermoso.
4. Construcción de 2 majanos en dehesa boyal de Montehermoso


Poda de ramas secas

Esta actuación se realizó en 300 pies de Quercus sp., de la dehesa boyal de Montehermoso



Corta de pies secos

Esta actuación se realizó en 500 pies de *Quercus* sp., en Navas Altas (Cañaveral)

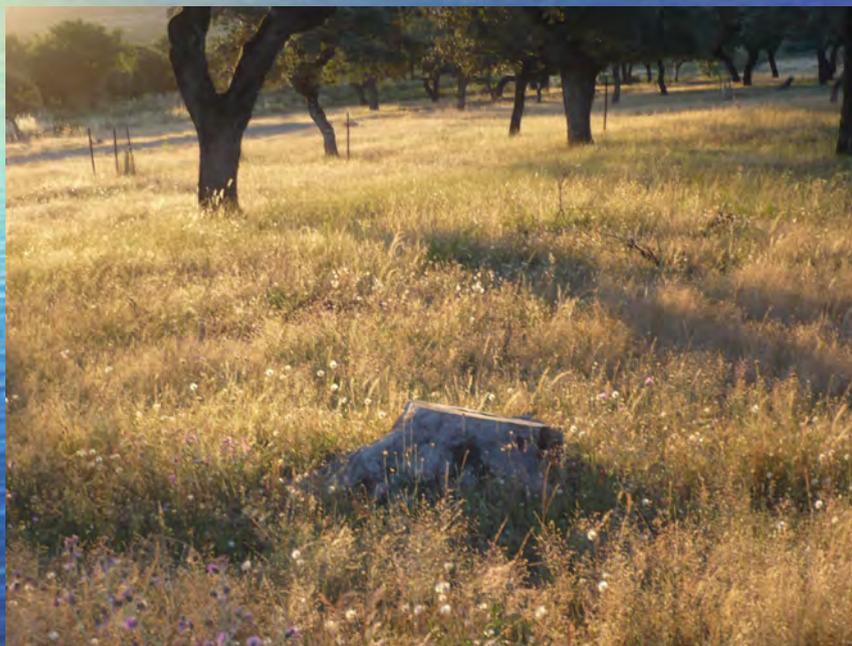

Desbroce manual en zonas de regenerado

Esta actuación se realizó en aproximadamente 10 ha de regenerado en la zona de desbroce mecanizado de Montehermoso



Construcción de 2 majanos

Esta actuación se realizó en Montehermoso, zona donde proliferan un gran nº de ejemplares de esta especie

