

**“PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS
FORESTALES EN EL MONTE
“TERRENOS COTOS” DEL T.M.
NAVACONCEJO (CÁCERES).”**


EXPEDIENTE 10N1012FD040



JUNTA DE EXTREMADURA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente.

Dirección General del Medio Natural



INFORME RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. (15 JUNIO DE 2011)

Presupuesto Licitación: 90.840,88 Euros

Presupuesto adjudicación: 90.086,90 Euros

Plazo de ejecución: 9 meses

Contratista: Extremadura Verde S.L.

Director de Obra: Rafael Martínez Hernández

PROYECTO COFINANCIADO POR:

Cofinanciado en un 70,00 % por los Fondos FEDER (Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013), Eje 3, Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención de Riesgos. Tema Prioritario: 51 Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza.

DATOS GENERALES.

Licitación	Negociado sin publicidad	22 Junio de 2010
Adjudicación	Extremadura Verde S.L.	25 Agosto de 2010
Plazo de ejecución		9 Meses

Presupuesto de Licitación	90.840,88	euros
----------------------------------	------------------	-------

Presupuesto adjudicación	90.086,90	euros
---------------------------------	------------------	-------

Coeficiente adjudicación	0,99169
---------------------------------	----------------

Fecha de finalización actuaciones
Mayo de 2011

**El Monte CC-3041 “Terrenos Cotos“, está situado
en el T.M de Navaconcejo (Valle del Jerte)**




Expediente 10N1012FD040

1. Monte “Terrenos Cotos”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Selección de brotes de castaños y desbroce del matorral 3-6 cm de diámetro.

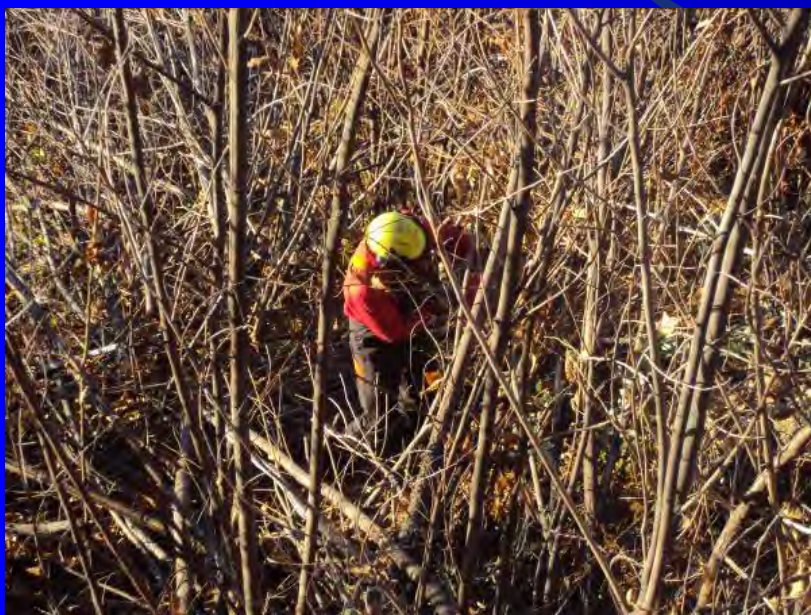

1. Monte “Terrenos Cotos”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Roza con triturado de resto, clareo y poda de pinos en densidad alta.



1. Monte “Terrenos Cotos”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Corta selectiva, con desramado y tronzado a 2,20 m de longitud, de pies afectados por incendios.



1. Monte “Terrenos Coto”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Recogida, apilado de restos de corta, poda y desbroce, distancia máxima 100 m.



1. Monte “Terrenos Coto”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Quema de residuos procedente de desbroces y desramados.



1. Monte “Terrenos Coto”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Astillado de restos de corta, poda y desbroce densidad alta, 15-25 Tm/Ha.



1. Monte “Terrenos Coto”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Picado de restos de selección de brotes, tamaño menor de 30 cm.



1. Monte “Terrenos Coto”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Desembosque de madera, con autocagador/skider, distancia máxima 200 m y apilado en cargadero.



1. Monte “Terrenos Cotos”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:

Cartel informativo

